


EJERCICIO RESUMEN DEL SÁBADO ANTERIOR

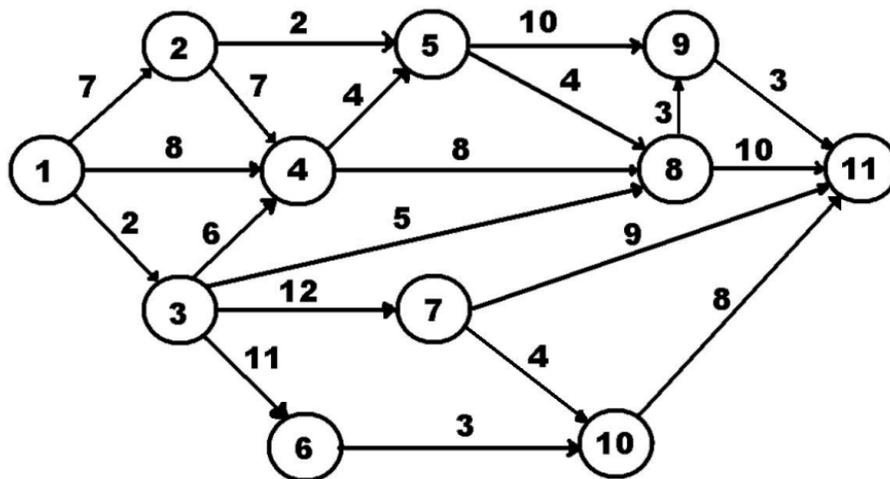

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA "GAVIOTA"

TAREAS	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN
1. Tarea 1-2	Relevamiento de Contabilidad	7
3. Tarea 1-3	Relevamiento de Caja	2
2. Tarea 1-4	Relevamiento de Presupuestos	8
4. Tarea 2-4	Relevamiento de Almacenes	7
5. Tarea 2-5	Revisión de formatos de los EE.FF.	2
6. Tarea 3-4	Relevamiento de Ventas	6
7. Tarea 3-6	Revisión de Movimientos de Caja - Un mes	11
8. Tarea 3-7	Auditoría General de Caja	12
9. Tarea 3-8	Revisión de los Procesos de Caja	5
10. Tarea 4-5	Revisión de Formatos de Entrada y Salida de Datos	4
11. Tarea 4-8	Resumen de relevamientos	8
12. Tarea 5-8	Estandarizar Formularios Principales	4
13. Tarea 5-9	Estandarizar Formularios Varios	10
14. Tarea 6-10	Consolidación de Información de Caja	3
15. Tarea 7-10	Cruzar Información de la Auditoría y la Revisión	4
16. Tarea 7-11	Elaboración de Dictámen de Caja	9
17. Tarea 8-9	Consolidar Formularios Principales	3
18. Tarea 8-11	Estandarizar Procesos	10
19. Tarea 9-11	Validar Formularios Varios con Personal Respectivo	3
20. Tarea 10-11	Elaborar Informe Consolidado de Caja	8

RECURSO	COSTO	TAREAS
CONSULTOR CONTADOR	25 Bs. x Hora	1-2, 1-3, 2-5, 3-7, 3-8, 6-10, 8-9, 10-11
CONSULTOR AUDITOR	30 Bs x Hora	1-4, 3-4, 3-6, 4-5, 5-8, 5-9, 7-10, 8-11, 10-11
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	18 Bs x Hora	2-4, 4-8, 9-11
PAQUETES DE 500 HOJAS	32 Bs x Paquete	SE COMPRÓ 15 PAQUETRES EN LA TAREA 1-2
TONER PARA IMPRESIONES	950 Bs x Unidad	SE COMPRÓ 2 UNDS EN LA TAREA 1-2
FOTOCOPIAS	0,20 Bs. x Hoja	1-3: 500 hojas, 2-5: 180 hojas, 4-8: 685 hojas
ALQUILER DE DATA SHOW	180 Bs x Día	10-11
REFRIGERIOS	18 Bs. x Persona x Día	PARA TODAS LAS TAREAS

SE PIDE:

1. COSTO DEL PROYECTO
2. FECHA DE FINALIZACIÓN SI SE INICIA EL PROYECTO EL 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO
3. DURACIÓN DEL PROYECTO
